Планування та впровадження відновлення та розвитку громад

Тарас Бик,
член правління
ГО “Агенція відновлення та розвитку”

АГЕНЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Додаток 1
до Порядку розроблення, реалізації та моніторингу плану відновлення та розвитку регіонів і планів відновлення та розвитку територіальних громад

ПЕРЕЛІК
проектів регіонального (місцевого) розвитку _____
(назва регіону)

Пріоритетний напрям відновлення та розвитку	Найменування проекту регіонального (місцевого) розвитку*	Найменування територіальної громади	Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту регіонального (місцевого) розвитку	Чисельність населення, на яку матиме вплив реалізація проекту регіонального (місцевого) розвитку, тис. осіб	Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект регіонального (місцевого) розвитку	Строки реалізації проекту регіонального (місцевого) розвитку (місяць, рік)		Очікувані результати реалізації проекту регіонального (місцевого) розвитку	Індикатори реалізації проекту регіонального (місцевого) розвитку			Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень					Відповідальні виконавці (структурний підрозділ місцевої держадміністрації або орган місцевого самоврядування)
						початок	завершення		найме-нування	одиниця вимірювання	прогнозоване (цільове) значення	всього	державний бюджет	місцевий бюджет	інші джерела		
															обсяг	назва джерела	
1. Відновлення житлового фонду																	
Багатоквартирні житлові будинки																	
Усього за напрямом																	
Індивідуальні житлові будинки																	
Усього за напрямом																	
Гуртожитки																	
Усього за напрямом																	
Інші об'єкти																	
Усього за напрямом																	
2. Відновлення об'єктів соціальної інфраструктури																	
Заклади дошкільної освіти																	
Усього за напрямом																	
Заклади загальної середньої освіти																	
Усього за напрямом																	
Заклади вищої																	

Реєстр Пошкодженого та Знищеного Майна?

Коротко-строкове відновлення

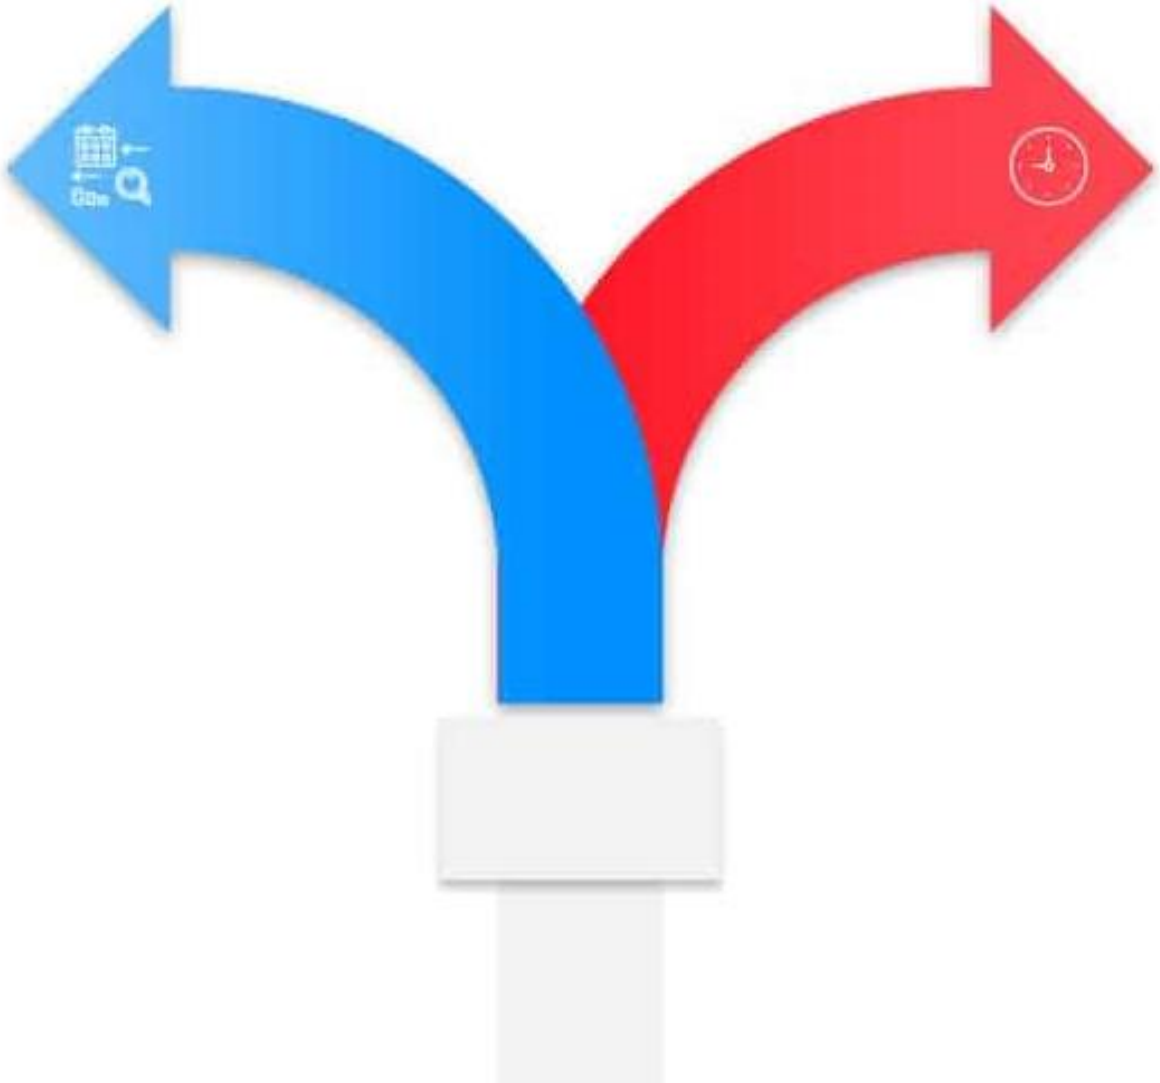

Довго-строковий розвиток

Планування відновлення громад

Створення Робочої групи громади

↓

Глибокий аналіз документів

↓

Проведення опитувань і фокус-груп

↓

Залучення ГО, бізнесів та інших стейкхолдерів

↓

Збір проєктів

↓

Фіналізація Плану відновлення

Регіональний форум
«Голос громадянського суспільства в формуванні та реалізації плану відновлення України»
МАНІФЕСТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
EUROPEAN
BOARD

Миколаївська
міська рада

АГЕНЦІЯ
ДНОВЛЕННЯ
А РОЗВИТКУ
MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS
OF DENMARK
UN
DP

Шаблон для написання Проектів відновлення

Найменування проекту місцевого розвитку	
Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту місцевого розвитку	
Чисельність населення, на яку матиме вплив реалізація проекту місцевого розвитку, тис. осіб	
Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект місцевого розвитку	
Строки реалізації проекту місцевого розвитку (місяць, рік) – початок і завершення	
Очікувані результати реалізації проекту місцевого розвитку	
Індикатори реалізації проекту місцевого розвитку	
найменування	
одиниця вимірювання	
прогнозоване (цільове) значення	
Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень	
всього	
державний бюджет	
місцевий бюджет	
інші джерела (обсяг і назва джерела)	
Відповідальні виконавці (структурний підрозділ органу місцевого самоврядування)	

Проекти відновлення та розвитку

		Priority area of recovery and development	Name of the regional (local) development project (with full address: district, territorial community, settlement, street (avenue, boulevard, lane, etc.), house number)	Name of the territorial community	The area to be affected by the project implementation	Population size, to be affected by the project's implementation, in thousands	Description of the problem that the project aims to solve	Start of project implementation (month, year)	Completion of project implementation (month, year)	Expected qualitative results from project implementation	Expected quantitative results from project implementation (indicators)			Estimated amounts and sources of funding, in UAH thous.				
											Name of the indicator	Unit(s) of measurement	Proposed (target) value	Total	State budget	Local budget	Other sources	
																	Amount	Source name
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1. Restoring the Housing Infrastructure																
CHAPTER 1.1	1.1.1	Condominiums	**Dismantling of a residential building at 249 Myr Avenue in Chernihiv, damaged due to military operations**	Chernihiv city territorial communiuty	Chernihiv	**7,2**	The damaged apartment building cannot be restored and poses a threat to the lives of city residents	March, 2024	September, 2024	Eliminating the critical consequences related to the damage to an apartment building due to the armed aggression of the Russian Federation	The number of objects to dismantle	**pcs.**	**1**	**47 449**	**0**	**3 559**	**43 890**	International grants and other sources not prohibited by law
	1.1.2	Condominiums	**Dismantling of a residential building at 15 Vyacheslava Chornovola Street, entrance 1,2 in Chernihiv, damaged due to military operations**	Chernihiv city territorial communiuty	Chernihiv	**13,5**	The damaged entrances to an apartment building cannot be restored and pose a threat to the lives of city residents	March, 2024	September, 2024	Eliminating the critical consequences related to the damage to an apartment building due to the armed aggression of the Russian Federation	The number of objects to dismantle	**pcs.**	**1**	**48 657**	**0**	**1 540**	**47 117**	International grants and other sources not prohibited by law
	1.1.3	Condominiums	**Major repairs (emergency restoration works) of a residential building at 246a Shevchenko Street in Chernihiv, damaged due to military operations**	Chernihiv city territorial communiuty	Chernihiv	**0,5**	Insulation of the building to prevent frost damage to the metal structures installed during the strengthening of the bearing capacity of the main and enclosing structures, as well as for aesthetic purposes. Restoration of elevators for the residents' comfort, major repairs of the leaking roof, and restoring the engineering networks to prevent basement flooding.	April, 2024	September, 2024	Preventing freezing in places where metal structures are installed. Insulation of the building as a whole and conservation of the heat and energy sources	Restored living space	**sq.m**	**6 105**	**24 960**	**0**	**0**	**24 960**	International grants and other sources not prohibited by law
	1.1.4	Condominiums	**Major repairs (emergency restoration works) of a residential building at 27 General Belov Street in Chernihiv, damaged due to military operations**	Chernihiv city territorial communiuty	Chernihiv	**0,6**	Insulation of the building to prevent frost damage to the metal structures installed during the strengthening of the bearing capacity of the main and enclosing structures, as well as for aesthetic purposes.	April, 2024	September, 2024	Preventing freezing in places where metal structures are installed. Insulation of the building as a whole and conservation of the heat and energy sources	Restored living space	**sq.m**	**5 397**	**19 077**	**0**	**0**	**19 077**	International grants and other sources not prohibited by law
	1.1.5	Condominiums	**Major repairs (emergency restoration works) of a residential building at 56 Ivan Mazepa Street in Chernihiv, damaged due to military operations**	Chernihiv city territorial communiuty	Chernihiv	**0,7**	Insulation of the building to prevent frost damage to the metal structures installed during the strengthening of the bearing capacity of the main and enclosing structures, as well as for aesthetic purposes.	April, 2024	September, 2024	Preventing freezing in places where metal structures are installed. Insulation of the building as a whole and conservation of the heat and energy sources	Restored living space	**sq.m**	**4 327**	**13 494**	**0**	**0**	**13 494**	International grants and other sources not prohibited by law
	1.1.6	Condominiums	**A pilot project in Chernihiv for the construction of multi-storey buildings (up to 15 floors) made of wood-based materials**	Chernihiv city territorial communiuty	Chernihiv	**0,6**	Restoration of the city's destroyed facilities, rapid expansion of the city's housing infrastructure. An opportunity to provide affordable housing for young families, low-income families, and IDPs. Shorter construction time and lower cost compared to traditional construction.	July, 2025	June, 2026	Constructing an apartment building using a new technology	The completion rate of the new apartment building construction using a new technology	**%**	**100%**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	International grants and other sources not prohibited by law
		Total by area	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**403 637**	**0**	**5 099**	**398 538**	–
		1.2. Private Homes																
		Total by area	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1.3 Dormitories																
CHAPTER 1.3	1.3.1	Dormitories	**A pilot project in Chernihiv to construct multi-story dormitories (up to 15 floors) from wood-based materials**	Chernihiv city territorial communiuty	Chernihiv	**1,2**	Restoration of the city's destroyed facilities, rapid expansion of the city's housing infrastructure. An opportunity to provide affordable housing for young families, low-income families, and IDPs. Shorter construction time and lower cost compared to traditional construction.	April, 2024	April, 2025	Constructing a dormitory building using a new technology	The completion rate of the new dormitory building construction using a new technology	**%**	**100%**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	
		Total by area	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**	–
		2. Restoring Social Infrastructure Facilities																

Додаток 1
до Порядку розроблення, реалізації та моніторингу плану відновлення та розвитку регіонів і планів відновлення та розвитку територіальних громад

ПЕРЕЛІК
проектів регіонального (місцевого) розвитку _____
(назва регіону)

Пріоритетний напрям відновлення та розвитку	Найменування проекту регіонального (місцевого) розвитку*	Найменування територіальної громади	Територія, на яку матиме вплив реалізація проекту регіонального (місцевого) розвитку	Чисельність населення, на яку матиме вплив реалізація проекту регіонального (місцевого) розвитку, тис. осіб	Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект регіонального (місцевого) розвитку	Строки реалізації проекту регіонального (місцевого) розвитку (місяць, рік)		Очікувані результати реалізації проекту регіонального (місцевого) розвитку	Індикатори реалізації проекту регіонального (місцевого) розвитку			Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень					Відповідальні виконавці (структурний підрозділ місцевої держадміністрації або орган місцевого самоврядування)
						початок	завершення		найме-нування	одиниця вимірювання	прогнозоване (цільове) значення	всього	державний бюджет	місцевий бюджет	інші джерела		
															обсяг	назва джерела	
1. Відновлення житлового фонду																	
Багатоквартирні житлові будинки																	
Усього за напрямом																	
Індивідуальні житлові будинки																	
Усього за напрямом																	
Гуртожитки																	
Усього за напрямом																	
Інші об'єкти																	
Усього за напрямом																	
2. Відновлення об'єктів соціальної інфраструктури																	
Заклади дошкільної освіти																	
Усього за напрямом																	
Заклади загальної середньої освіти																	
Усього за напрямом																	
Заклади вищої																	

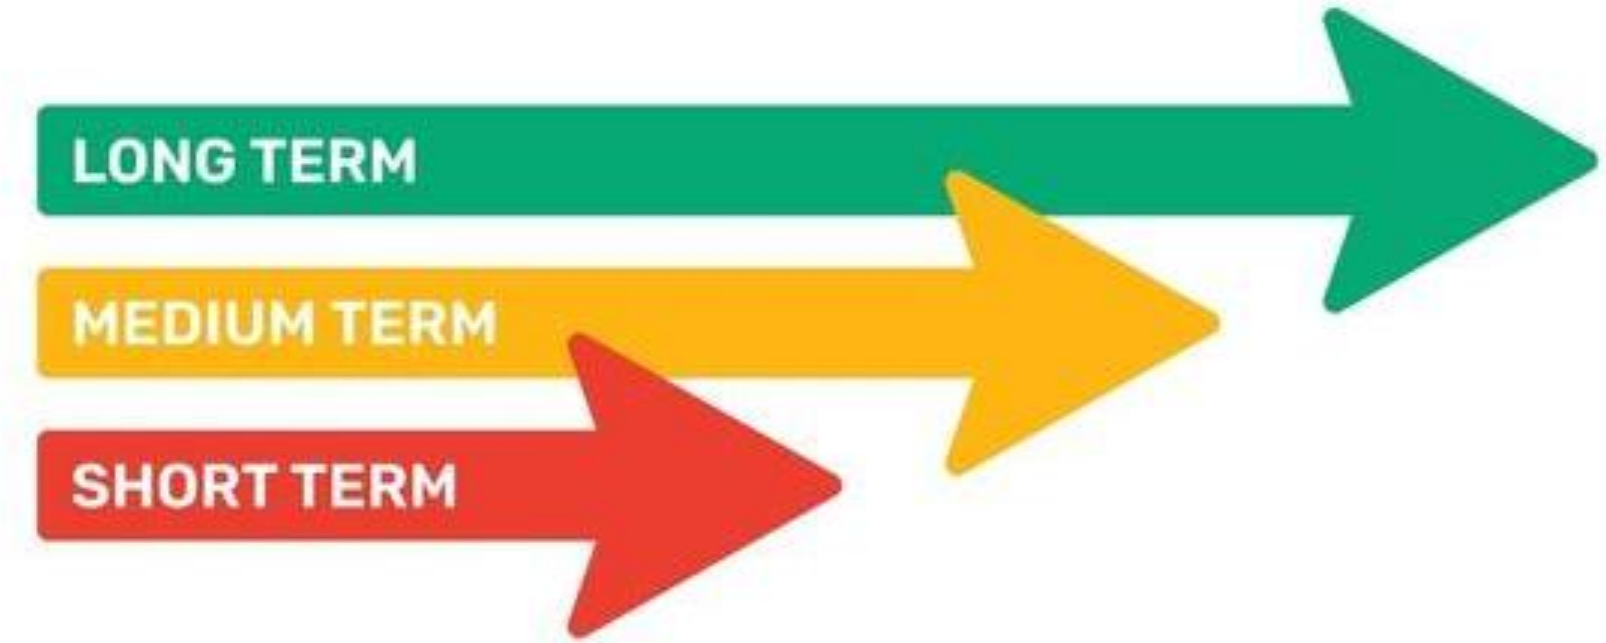

Підготовлені Плани відновлення громад:

Громада	*Кількість проєктів*	*Вартість проєктів*
• Миколаїв	• 401	• 60,9 млрд грн
• Чернігів	• 125	• 16,6 млрд грн
• Ніжин, Чернігівська обл.	• 89	• 5,5 млрд грн
• Біла Церква, Київська обл.	• 145	• 13,6 млрд грн
• Нововолинськ, Волинська обл.	• 144	• 13,0 млрд грн
• Мирноград, Донецька обл.	• 97	• 4,7 млрд грн
• Куяльник, Одеська обл.	• 281	• 4,1 млрд грн
• Вижниця, Чернівецька обл.	• 59	• 0,8 млрд грн
• Хмелів, Сумська обл.	• 45	• 0,6 млрд грн
9 (зі 1469 громад)	***1356 проєктів***	***120 млрд грн***

Впровадження Плану відновлення / Стратегії розвитку

АГЕНЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Стратегія – 10%

Впровадження – 90%

Структура по впровадженню Плану відновлення / Стратегії розвитку

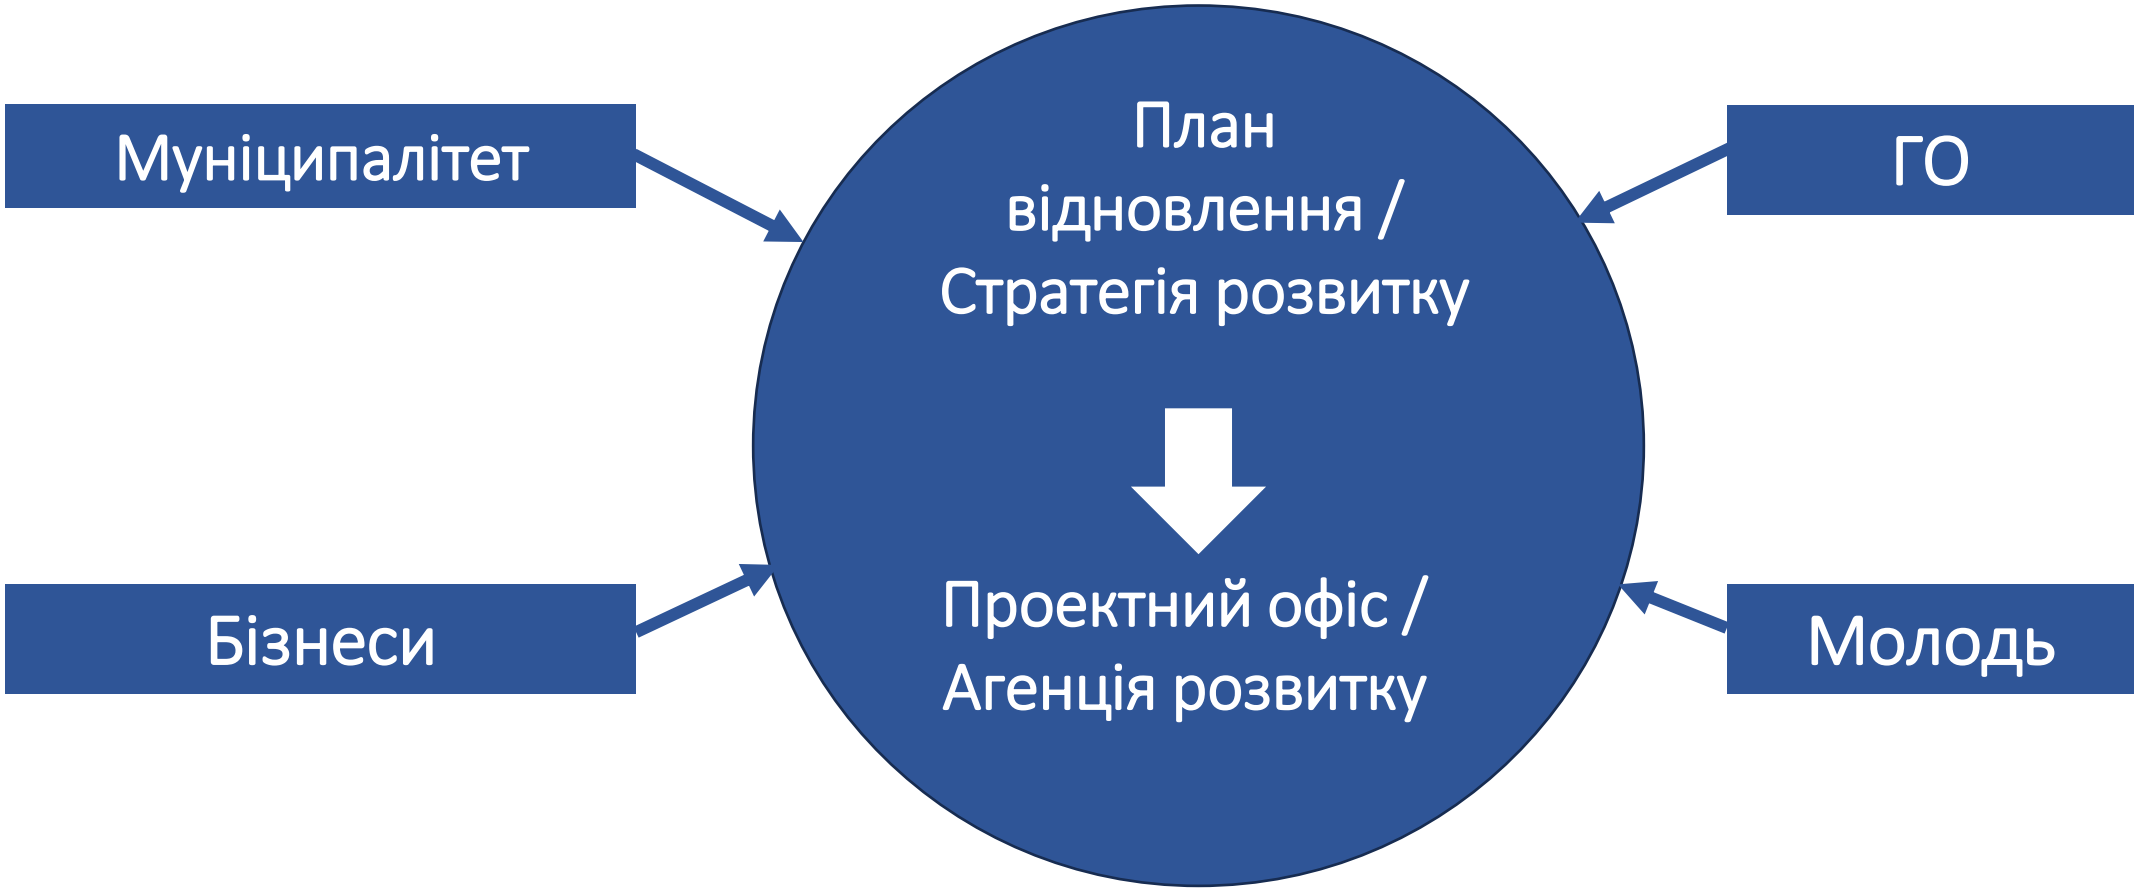

Ефект структур впровадження

Ефект структур впровадження: Рівне *(грн)*

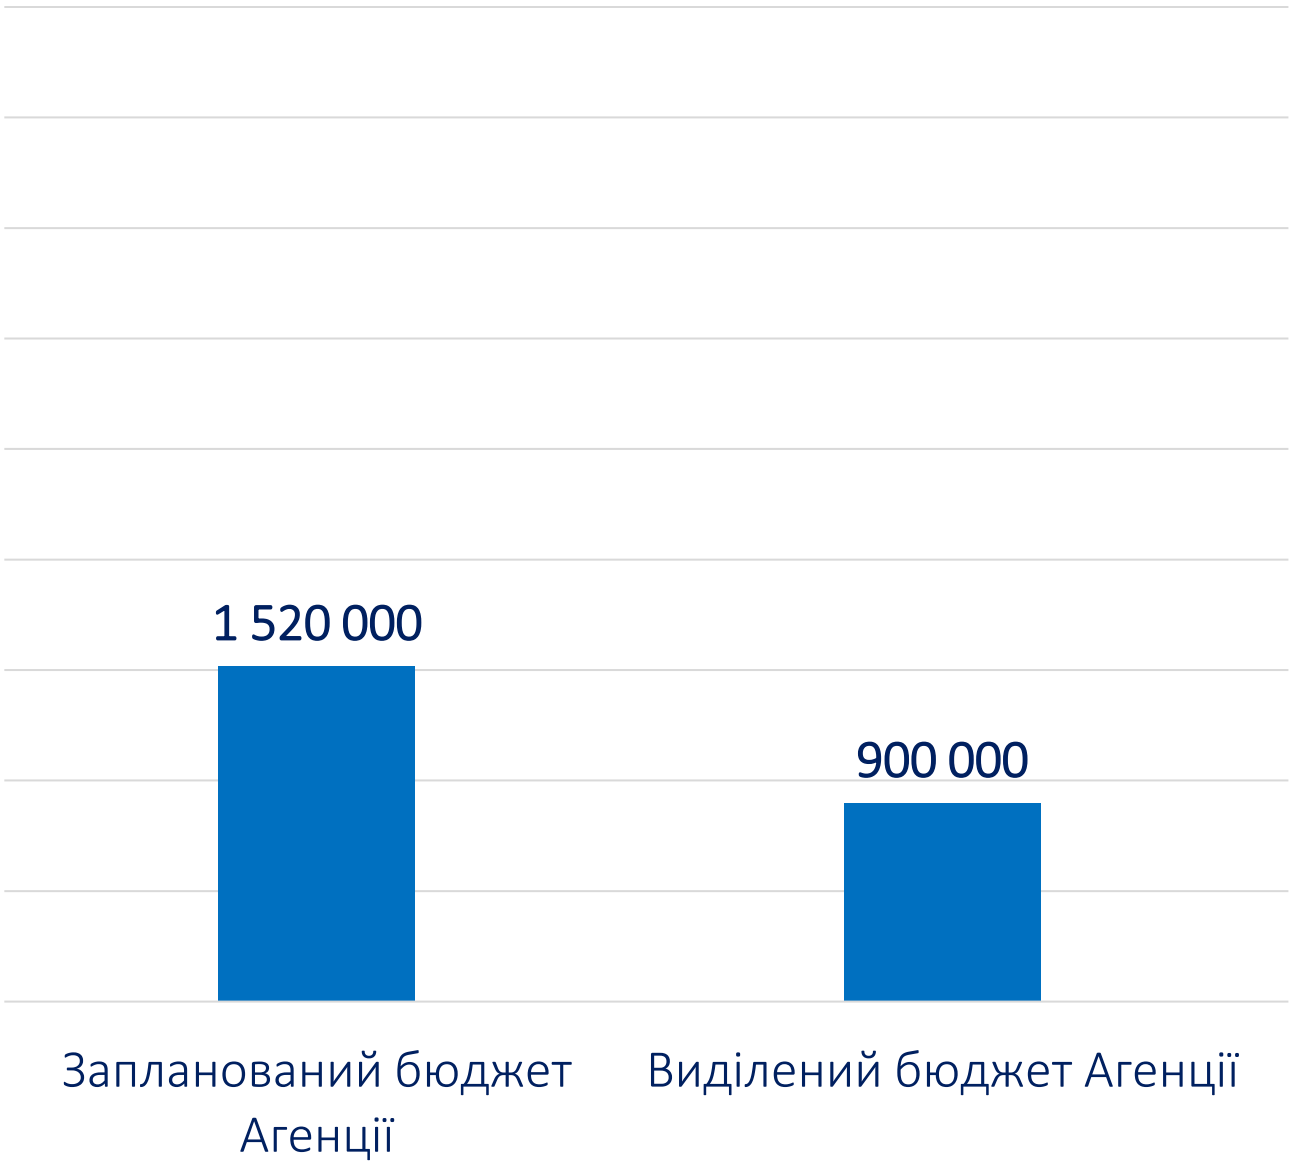

Рецепти успіху

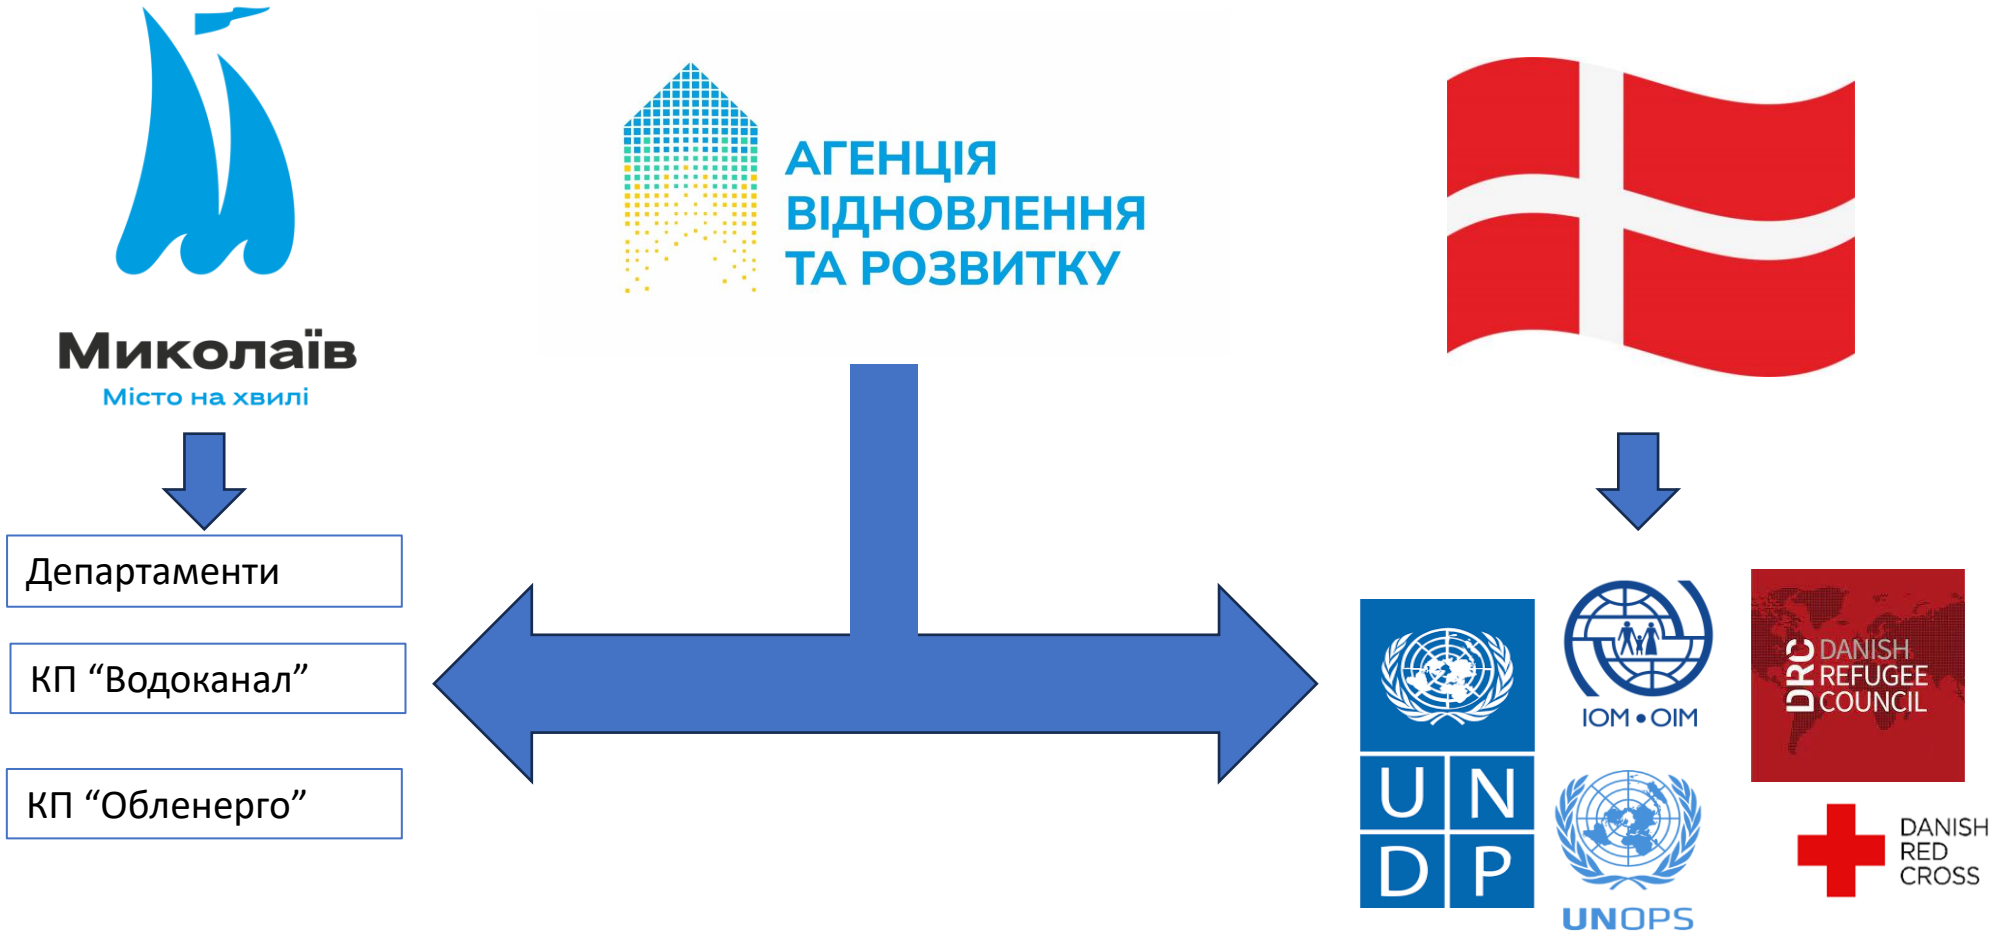

АГЕНЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Рецепти успіху

Проекти, проекти, проекти!

English

Доброчесність

Матриця відновлення

АГЕНЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

https://www.facebook.com/AgencyforRecoveryandDevelopment

https://ard-ukraine.org.ua/

План відновлення та розвитку / Стратегія розвитку

1. Безпека
2. Економіка
3. Інфраструктура
4. Гуманітарна сфера

Завдання	Партнери і ресурси
1.1. Забезпечити розмінування громади	Центр гуманітарного розмінування. Міжнародні структури ООН (UNDP, OCHA, UNHCR, UNOPS, OHCHR). Міжнародні організації (GIHCD, ICRC, OSCE). Фонд Говарда Баффета The HALO Trust Данська ради у справах біженців в Україні (DRC) Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD) Норвезька народна допомога (NPA) Естонська асоціація рятувальників Handicap International Norsk Folkenhelp MAG International DanChurchAid Українські неурядові організації: Асоціація саперів України, «Demining Solutions», Центр екологічних ініціатив «Екодія». Іноземні компанії з досвідом розмінування в інших країнах.
1.2. Забезпечити громаду спорудами цивільного захисту та укриттями	Дитячий фонд UNICEF. Товариство Червоного Хреста України. Проект Київської школи економіки «Безпечна освіта». Програма «Безпечна школа» Фонду Східна Європа. Благодійний фонд «savED».

Завдання	Партнери і ресурси
1.3. Забезпечити громаду надійною системою оповіщення тривоги	Chemonics. Фонд “Партнерство за сильну Україну”. Українські та іноземні комерційні структури.
1.4. Скоординувати і підвищити рівень громадської безпеки у громаді (Створити Центр безпеки громадян / Муніципальну варту)	Програма “Громадська безпека та соціальна згуртованість” ПРООН. Компанія «DAI» (виконавець проєкту USAID ERA). Товариство Червоного Хреста України. Програма U-LEAD.
1.5. Підвищити рівень безпеки в освітніх закладах	Проект Київської школи економіки «Безпечна освіта». Програма “Громадська безпека та соціальна згуртованість” ПРООН. Компанія «DAI» (виконавець проєкту USAID ERA). Товариство Червоного Хреста України. Програма U-LEAD. Українські та іноземні комерційні структури.
1.6. Розробити програму «Захист України»	Міністерство освіти і науки України. Український інститут національної пам’яті. Молодіжна організація “Пласт”.
1.7. Забезпечити громаду комплексним вуличним освітленням	Фонд енергоефективності. Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН. Українські та іноземні комерційні структури.

Завдання	Партнери і ресурси
1.8. Встановити / розширити систему відеоспостереження	Українські та іноземні комерційні структури.
1.9. Підвищити рівень безпеки на дорогах	Кампанія “За безпечні дороги” ГО “Zero Vision”
1.10. Підвищити рівень безпеки на водоймах	Центр громадського здоров’я. Товариство Червоного Хреста України.
1.11. Підвищити рівень протипожежної безпеки в громаді	Товариство Червоного Хреста України. Українські та іноземні комерційні структури.
1.12. Вирішити проблему з безпритульними тваринами	Програма “Громадська безпека та соціальна згуртованість” ПРООН. Українські та іноземні громадські організації (Фонд “UAnimals”) та благодійні фонди (MacPaw Foundation), проекти комерційних структур (Компанія “Suziria Group”).

Завдання	Партнери і ресурси
2.1. Забезпечити системну підтримку мікро-, макро-, малого та середнього бізнесу	Держпрограма Єробота Дія.City Український фонд стартапів (Фонд розвитку інновацій) Проект «Доступ до фінансування та підтримка стійкості мікро-, малих та середніх підприємств України» (Ощадбанк за фінансової підтримки Німеччини) Програма “Початок” для жінок-підприємниць Проєкт USAID “Економічна підтримка України” Проєкт USAID “Інвестиції для стійкості бізнесу” Проєкт USAID “Конкурентоспроможна економіка України” Проєкт USAID “Демократичне врядування у Східній Україні” (DG East) Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН Програма ЄС “Горизонт Європа” EU4Business за фінансування ЄС та Німеччини Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI) Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) Центр економічного зростання LRHub Всеукраїнська економічна платформа «Зроблено в Україні» ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо)
2.2. Забезпечити підтримку аграрного бізнесу	Державний аграрний реєстр. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) Програма з аграрного і сільського розвитку USAID AGRO та програма «Ініціатива стійкості сільського господарства в Україні» USAID AGRI Проект Світового Банку ARISE Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Агроцентр.

Завдання	Партнери і ресурси
2.3. Забезпечити розвиток промисловості з наголосом на переробній галузі	Грантова програма МінЕкономіки єРобота. Проєкт USAID “Інвестиції для стійкості бізнесу” Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо). Українські та іноземні інвестори. Проєкт «Економічна підтримка України» USAID-ERA Всеукраїнська економічна платформа «Зроблено в Україні»
2.4. Створити умови для видобутку природніх ресурсів	Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (American Chamber of Commerce (ACC), European Business Association (EBA), US-Ukraine Business Council (USUBC) тощо). Українські та іноземні інвестори. Центр екологічних ініціатив «Екодія».
2.5. Створити умови для розвитку експортних можливостей	ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» Міжнародна платформа МЗС NAZOVNI EU4Business за фінансування ЄС та Німеччини Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) Всеукраїнська економічна платформа «Зроблено в Україні» Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо)

Завдання	Партнери і ресурси
2.6. Створити індустріальний парк	Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо). Українські та іноземні інвестори. Всеукраїнська економічна платформа «Зроблено в Україні» .
2.7. Створити інноваційний район	
2.8. Розвинути сферу медичних послуг	Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН. Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо). Українські та іноземні інвестори.
2.9. Забезпечити розвиток соціального підприємництва	Western NIS Enterprise Fund. School of ME: Школа усвідомленого підприємництва. Український соціальний венчурний фонд.
2.10. Забезпечити розвиток туризму та рекреаційного сектору	Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо). Українські та іноземні інвестори.

Завдання	Партнери і ресурси
3.1. Створити умови для якісного просторового розвитку громади	Український міжнародний інститут відновлення BigCityLab Урбаністична коаліція Ro3kvit Архітектурне бюро ZOTOV&CO
3.2. Відновити житловий сектор і забезпечити реновацію житла	Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Програма «єВідновлення» Програма Фонду енергоефективності «ВідновиДім» United24 Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН Проект Ради Європи Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні Соціально відповідальний бізнес (Фонд Леруа Мерлен тощо). ГО "Міські реформи" (Urban Reform) Аналітичний центр CEDOS
3.3. Забезпечити житло для окремих категорій населення: ВПО, бездомних	
3.4. Забезпечити якісну систему водопостачання та водовідведення	Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН Mykolaiv Water Hub

Завдання	Партнери і ресурси
3.5. Втілити принципи Зеленого курсу / Забезпечити високі показники енергоефективності	Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP). Програма «Стала енергетика і довкілля» ПРООН. Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO). Інститут загальної енергетики НАН України та ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження НУБіП Проект ЄІБ “Енергоефективність громадських будівель в Україні” Проєкт підтримки переходу для вугледобувних регіонів ЄБРР. Східноєвропейське Партнерство у сфері енергоефективності та екології (E5P). Програма «Енергодім» Фонду енергоефективності. Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо). Українські та іноземні інвестори. Українська асоціація відновлювальної енергетики Центр екологічних ініціатив «Екодія». Mykolaiv Water Hub. Greenpeace.
3.6. Забезпечити проведення / розширення мережі газопостачання	Міністерство енергетики України. ГК «Нафтогаз України».

Завдання	Партнери і ресурси
3.7. Налагодити якісну систему поводження з побутовими відходами	Швейцарсько-український проект DESPRO. Обласні фонди охорони навколишнього природного середовища. Центр екологічних ініціатив «Екодія».
3.8. Відновити та відремонтувати дороги та тротуари	Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
3.9. Забезпечити якісне транспортне сполучення	ЄБРР ЄІБ Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН. Кампанія “За безпечні дороги” ГО “Zero Vision” U-Cycle, ГО “Асоціація велосипедистів Києва”

Завдання	Партнери і ресурси
3.10. Створити умови для розвитку річкового та морського транспорту	ЄБРР, ЄІБ. Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН. Кампанія “За безпечні дороги” ГО “Zero Vision”. Адміністрація морських портів України. Українське Дунайське пароплавство. Порти іноземних країн (Південної Луїзіани, Нового Орлеану). Асоціація «Аеропорти України»
3.11. Забезпечити відновлення портової інфраструктури	
3.12. Забезпечити відновлення аеропорту	
3.13. Забезпечити озеленення громади	Центр екологічних ініціатив «Екодія».
3.14. Вирішити проблему забруднення річки	
3.15. Забезпечити інклюзію та безбар’єрність	Державний портал Україна. Інклюзія. Волонтерська платформа “Доступно.UA” ГО “Безбар’єрність”. Урбан-бюро BigCityLab. Школа універсального дизайну. Українське товариство глухих. Українське товариство сліпих. Спілка громадських організацій людей з інвалідністю Києва.

Завдання	Партнери і ресурси
3.16. Розвивати діджиталізацію	Міністерство цифрової трансформації в Україні Програма EGAP Українські комерційні структури
3.17. Забезпечити відновлення банківських послуг і зв’язку	Ощадбанк Приватбанк Укрпошта Нова пошта Київстар/Водафон/Lifecell
3.18. Забезпечити високий рівень ритуальних послуг	

Завдання	Партнери і ресурси
4.1. Переосмислити роль освіти. Відновити школи і садочки, створити сучасні освітні простори	Дитячий фонд UNICEF. Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН. Товариство Червоного Хреста України. Проект Київської школи економіки «Безпечна освіта». Програма «Безпечна школа» Фонду Східна Європа. Благодійний фонд «savED». Проєкт SURGe Організація Save the Children IREX Crown Agents Урбан-бюро “Big City Lab”. Проєкт "Гроші для дитини, дитинство в сім'ї, послуги в громаді" ГС "Українська мережа за права дитини" (USAID/ГОВЕРЛА) Проект EdUP за підтримки уряду Швейцарії Проєкт ЄС Skills4Recover Програма “Кусаноне” Посольства Японії в Україні

Завдання	Партнери і ресурси
4.2. Забезпечити надання якісних медичних послуг з високим рівнем психологічних послуг	Центр громадського здоров’я. Товариство Червоного Хреста України. Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН. Дитячий фонд UNICEF. Українські та міжнародні комерційні проекти. Проект “LifeLine Ukraine” Програма “Кусаноне” Посольства Японії в Україні
4.3. Забезпечити надання якісних адміністративних та соціальних послуг населенню громади	єРобота Український ветеранський фонд Програма “Громадська безпека та соціальна згуртованість” ПРООН. Центр громадського здоров’я. Товариство Червоного Хреста України. Проект “LifeLine Ukraine”. Проект “Base 4.5.0”. Проект «Після служби». Дитячий фонд UNICEF. Програма DESPRO. Програма SALAR. Громадська організація “Юридична сотня”.

Завдання	Партнери і ресурси
4.4. Створити умови для розвитку молоді	Програма «Демократичне врядування» ПРООН. Міжнародний республіканський інститут (IRI). IREX “Мріємо та діємо” ICAP “Єднання”. Молодіжна організація “Пласт”. Корпус миру США (PeaceCorps).
4.5. Забезпечити розвиток культури, збереження спадщини та пам’яток архітектури	Український культурний фонд. Проект “Мапа реновації”. House of Europe. USAID Engage. Проект “EU4Culture”. Програма “Місцеве самоврядування та реформа децентралізації влади” ПРООН. Урбан-бюро “Big City Lab”.

Завдання	Партнери і ресурси
4.6. Створити умови для реабілітації та соціалізації ветеранів	Міністерство у справах ветеранів Український інститут національної пам’яті Молодіжна організація “Пласт” єРобота Український ветеранський фонд Програма “Громадська безпека та соціальна згуртованість” ПРООН Центр громадського здоров’я Товариство Червоного Хреста України IREX Громадська організація “Юридична сотня” Проект “LifeLine Ukraine” Проект “Base 4.5.0” Проект «Після служби» Програма “Кусаноне” Посольства Японії в Україні
4.7. Створити умови для розвитку спорту та фізичних активностей	Дитячий фонд UNICEF Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН

Завдання	Партнери і ресурси
1.1. Забезпечити розмінування громади	Центр гуманітарного розмінування. Міжнародні структури ООН (UNDP, OCHA, UNHCR, UNOPS, OHCHR). Міжнародні організації (GIHCD, ICRC, OSCE). Фонд Говарда Баффета The HALO Trust Данська ради у справах біженців в Україні (DRC) Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD) Норвезька народна допомога (NPA) Естонська асоціація рятувальників Handicap International Norsk Folkenhelp MAG International DanChurchAid Українські неурядові організації: Асоціація саперів України, «Demining Solutions», Центр екологічних ініціатив «Екодія». Іноземні компанії з досвідом розмінування в інших країнах.
1.2. Забезпечити громаду спорудами цивільного захисту та укриттями	Дитячий фонд UNICEF. Товариство Червоного Хреста України. Проект Київської школи економіки «Безпечна освіта». Програма «Безпечна школа» Фонду Східна Європа. Благодійний фонд «savED».

Завдання	Партнери і ресурси
1.3. Забезпечити громаду надійною системою оповіщення тривоги	Chemonics. Фонд “Партнерство за сильну Україну”. Українські та іноземні комерційні структури.
1.4. Скоординувати і підвищити рівень громадської безпеки у громаді (Створити Центр безпеки громадян / Муніципальну варту)	Програма “Громадська безпека та соціальна згуртованість” ПРООН. Компанія «DAI» (виконавець проєкту USAID ERA). Товариство Червоного Хреста України. Програма U-LEAD.
1.5. Підвищити рівень безпеки в освітніх закладах	Проект Київської школи економіки «Безпечна освіта». Програма “Громадська безпека та соціальна згуртованість” ПРООН. Компанія «DAI» (виконавець проєкту USAID ERA). Товариство Червоного Хреста України. Програма U-LEAD. Українські та іноземні комерційні структури.
1.6. Розробити програму «Захист України»	Міністерство освіти і науки України. Український інститут національної пам’яті. Молодіжна організація “Пласт”.
1.7. Забезпечити громаду комплексним вуличним освітленням	Фонд енергоефективності. Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН. Українські та іноземні комерційні структури.

Завдання	Партнери і ресурси
1.8. Встановити / розширити систему відеоспостереження	Українські та іноземні комерційні структури.
1.9. Підвищити рівень безпеки на дорогах	Кампанія “За безпечні дороги” ГО “Zero Vision”
1.10. Підвищити рівень безпеки на водоймах	Центр громадського здоров’я. Товариство Червоного Хреста України.
1.11. Підвищити рівень протипожежної безпеки в громаді	Товариство Червоного Хреста України. Українські та іноземні комерційні структури.
1.12. Вирішити проблему з безпритульними тваринами	Програма “Громадська безпека та соціальна згуртованість” ПРООН. Українські та іноземні громадські організації (Фонд “UAnimals”) та благодійні фонди (MacPaw Foundation), проекти комерційних структур (Компанія “Suziria Group”).

Завдання	Партнери і ресурси
2.1. Забезпечити системну підтримку мікро-, макро-, малого та середнього бізнесу	Держпрограма Єробота Дія.City Український фонд стартапів (Фонд розвитку інновацій) ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» Всеукраїнська економічна платформа «Зроблено в Україні» Програма “Початок” для жінок-підприємниць Проект «Доступ до фінансування та підтримка стійкості мікро-, малих та середніх підприємств України» (Ощадбанк за фінансової підтримки Німеччини) Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН Програма USAID “Економічна підтримка України” Програма USAID “Інвестиції для стійкості бізнесу” Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” Програма USAID “UCBI: Зміцнення громадської довіри в Україні” Програма USAID “Демократичне врядування у Східній Україні” (DG East) Проект “U-LEAD з Європою” Програма “Interreg Europe” Програма “Горизонт Європа” EU4Business за фінансування ЄС та Німеччини Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI) Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) Центр економічного зростання LRHub Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації: American Chamber of Commerce (ACC), European Business Association (EBA), US-Ukraine Business Council (USUBC) тощо

Завдання	Партнери і ресурси
2.2. Забезпечити підтримку аграрного бізнесу	Державний аграрний реєстр Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) Проект Світового Банку ARISE Програма USAID “Врожай” Програма USAID з аграрного і сільського розвитку “AGRO” Проєкт USAID “Демократичне врядування у Східній Україні” (DG East) Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Агроцентр
2.3. Забезпечити розвиток промисловості з наголосом на переробній галузі	Грантова програма МінЕкономіки єРобота Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Всеукраїнська економічна платформа «Зроблено в Україні» Проєкт USAID “Економічна підтримка України” Проєкт USAID “Інвестиції для стійкості бізнесу” Проєкт USAID “Конкурентоспроможна економіка України” Проєкт USAID “Демократичне врядування у Східній Україні” (DG East) Програма ЄС “Горизонт Європа” Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо) Українські та іноземні інвестори.
2.4. Створити умови для видобутку природніх ресурсів	Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації: ACC, EBA, USUBC тощо Українські та іноземні інвестори Центр екологічних ініціатив «Екодія»

Завдання	Партнери і ресурси
2.5. Створити умови для розвитку експортних можливостей	ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» Міжнародна платформа МЗС NAZOVNI EU4Business за фінансування ЄС та Німеччини Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) Всеукраїнська економічна платформа «Зроблено в Україні» Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо)
2.6. Створити індустріальний парк	Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо). Українські та іноземні інвестори Всеукраїнська економічна платформа «Зроблено в Україні» Проект Academ.City
2.7. Створити інноваційний район / інноваційний парк	
2.8. Розвинути сферу медичних послуг	Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо) Українські та іноземні інвестори
2.9. Забезпечити розвиток соціального підприємництва	Western NIS Enterprise Fund School of ME: Школа усвідомленого підприємництва Український соціальний венчурний фонд
2.10. Забезпечити розвиток туризму та рекреаційного сектору	Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо) Українські та іноземні інвестори

Завдання	Партнери і ресурси
3.1. Створити умови для якісного просторового розвитку громади	Український міжнародний інститут відновлення Урбан-бюро “Big City Lab”. Урбаністична коаліція Ro3kvit Архітектурне бюро ZOTOV&CO
3.2. Відновити житловий сектор і забезпечити реновацію житла	Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Програма «єВідновлення». Програма Фонду енергоефективності «ВідновиДім». United24. Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН. Проект Ради Європи Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні. Соціально відповідальний бізнес (Фонд Леруа Мерлен тощо). ГО "Міські реформи" (Urban Reform). Аналітичний центр CEDOS.
3.3. Забезпечити житло для окремих категорій населення: ВПО, бездомних	
3.4. Забезпечити якісну систему водопостачання та водовідведення	Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН. Mykolaiv Water Hub

Завдання	Партнери і ресурси
3.5. Втілити принципи Зеленого курсу / Забезпечити високі показники енергоефективності	Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Програма «Енергодім» Фонду енергоефективності Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP) Програма «Стала енергетика і довкілля» ПРООН Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) Програма USAID “Підтримка енергетичної безпеки” Програма USAID “SPARC” Проект ЄІБ “Енергоефективність громадських будівель в Україні” Проєкт підтримки переходу для вугледобувних регіонів ЄБРР Програма “Горизонт Європа” Програма ЄС “LIFE” Програма ЄС “ЄІТ – Інноваційна енергія” Східноєвропейське Партнерство у сфері енергоефективності та екології (E5P) Міжнародні ділові палати та бізнес-асоціації (ACC, EBA, USUBC тощо) Українські та іноземні інвестори Українська асоціація відновлювальної енергетики Інститут загальної енергетики НАН України та ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження НУБіП Центр екологічних ініціатив «Екодія» Mykolaiv Water Hub Greenpeace

Завдання	Партнери і ресурси
3.6. Проведення / розширення мережі газопостачання	Міністерство енергетики України ГК «Нафтогаз України»
3.7. Налагодити якісну систему поводження з побутовими відходами	Швейцарсько-український проект DESPRO. Обласні фонди охорони навколишнього природного середовища. Центр екологічних ініціатив «Екодія».
3.8. Відновити та відремонтувати дороги та тротуари	Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
3.9. Забезпечити якісне транспортне сполучення	ЄБРР ЄІБ Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН Програма ЄС “ЄІТ – Міська мобільність” Кампанія “За безпечні дороги” ГО “Zero Vision” U-Cycle, ГО “Асоціація велосипедистів Києва”

Завдання	Партнери і ресурси
3.10. Створити умови для розвитку річкового та морського транспорту	ЄБРР, ЄІБ. Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН. Кампанія “За безпечні дороги” ГО “Zero Vision”. Адміністрація морських портів України. Українське Дунайське пароплавство. Порти іноземних країн (Південної Луїзіани, Нового Орлеану). Асоціація «Аеропорти України»
3.11. Забезпечити відновлення портової інфраструктури	
3.12. Забезпечити відновлення аеропорту	
3.13. Забезпечити озеленення громади	Центр екологічних ініціатив «Екодія».
3.14. Вирішити проблему забруднення річки	
3.15. Забезпечити інклюзію та безбар’єрність	Державний портал Україна. Інклюзія. Волонтерська платформа “Доступно.UA” ГО “Безбар’єрність”. Урбан-бюро BigCityLab. Школа універсального дизайну. Українське товариство глухих. Українське товариство сліпих. Спілка громадських організацій людей з інвалідністю Києва.

Завдання	Партнери і ресурси
3.16. Розвивати діджиталізацію	Міністерство цифрової трансформації в Україні Програма USAID “Підтримка цифрової трансформації” Програма ЄС “ЄІТ – Цифровізація” Програма EGAP Українські комерційні структури
3.17. Забезпечити відновлення банківських послуг і зв’язку	Ощадбанк Приватбанк Укрпошта Нова пошта Київстар/Водафон/Lifecell
3.18. Забезпечити високий рівень ритуальних послуг	

Завдання	Партнери і ресурси
4.1. Переосмислити роль освіти. Відновити школи і садочки, створити сучасні освітні простори	Дитячий фонд UNICEF Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН Товариство Червоного Хреста України. Програма ЄС “Горизонт Європа” Програма ЄС “Erasmus+” Програма «Безпечна школа» Фонду Східна Європа. Проєкт “SURGe” IREX Проєкт "Гроші для дитини, дитинство в сім'ї, послуги в громаді" ГС "Українська мережа за права дитини" (USAID/ГОВЕРЛА) Проект EdUP за підтримки уряду Швейцарії Проєкт ЄС “Skills4Recovery” Програма “Кусаноне” Посольства Японії в Україні Проект Київської школи економіки “Безпечна освіта” Благодійний фонд «savED». Організація “Save the Children” Crown Agents Урбан-бюро “Big City Lab” ГО “Навчай для України”

Завдання	Партнери і ресурси
4.2. Забезпечити надання якісних медичних послуг з високим рівнем психологічних послуг	Центр громадського здоров’я Товариство Червоного Хреста України Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН Дитячий фонд UNICEF Програма USAID “Розбудова стійкості системи громадського здоров’я” Програма USAID “Rehab4U” Програма USAID “Безпечні та доступні ліки SAFE Med” Програма USAID “Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні” Програма USAID “Інновації для подолання епідемії ВІЛ” Програма “EU4Health” Програма “Кусаноне” Посольства Японії в Україні Українські та міжнародні комерційні проекти Проект “LifeLine Ukraine”
4.3. Забезпечити надання якісних адміністративних та соціальних послуг населенню громади	єРобота Український ветеранський фонд Програма “Громадська безпека та соціальна згуртованість” ПРООН Дитячий фонд UNICEF Проект “U-LEAD з Європою” Програма DESPRO Програма SALAR Товариство Червоного Хреста України Проект “LifeLine Ukraine” Проект “Base 4.5.0” Проект «Після служби» Громадська організація “Юридична сотня”

Завдання	Партнери і ресурси
4.4. Створити умови для розвитку молоді	Програма «Демократичне врядування» ПРООН Програма USAID “Молодь як провідник української національної ідентичності” Міжнародний республіканський інститут (IRI) IREX “Мріємо та діємо” ICAP “Єднання” Молодіжна організація “Пласт” Корпус миру США (PeaceCorps)
4.5. Забезпечити розвиток культури, збереження спадщини та пам’яток архітектури	Український культурний фонд Проект “Мапа реновації” House of Europe USAID Engage Проект “EU4Culture” Програма “Місцеве самоврядування та реформа децентралізації влади” ПРООН Урбан-бюро “Big City Lab”

Завдання	Партнери і ресурси
4.6. Створити умови для реабілітації та соціалізації ветеранів	Міністерство у справах ветеранів Український інститут національної пам’яті єРобота Український ветеранський фонд Центр громадського здоров’я Програма “Громадська безпека та соціальна згуртованість” ПРООН Товариство Червоного Хреста України Проект USAID “Rehab4U” Програма USAID “Демократичне врядування у Східній Україні” (DG East) IREX Молодіжна організація “Пласт” Громадська організація “Юридична сотня” Проект “LifeLine Ukraine” Проект “Base 4.5.0” Проект “Після служби”
4.7. Створити умови для розвитку спорту та фізичних активностей	Дитячий фонд UNICEF. Програма «Економічне відновлення та розвиток інфраструктури» ПРООН.

Дякую за увагу!

АГЕНЦІЯ
ВІДНОВЛЕННЯ
ТА РОЗВИТКУ
